






PROGETTO ESECUTIVO 3083

**LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DEI PORTI DI SAVONA, VADO, CARIGNANO, PORTO ANTICO, DI
NEGRO, SAN BENIGNO, SAMPIERDARENA, AEROPORTO, PEGLI, SESTRI, VOLTRI,
PRÀ.**

PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO:
Rev. 0	Ottobre 2018	Prima emissione	
<u>CSP interni:</u>		<u>Progettisti esterni:</u>	
Ing. Davide Sciutto 			
Coordinatore di progetto:	VERIFICATO	VALIDATO	VISTO
Ing. Davide Sciutto 	Ing. Caterina Vincenzi 	Il responsabile del procedimento: Dott. Geol. Giuseppe Canepa 	Il Direttore Tecnico: Ing. Flavio Destefanis 

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PREMESSA.....	4
PARTE A: IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEGLI OGGETTI COINVOLTI.....	5
ANAGRAFICA DEL CANTIERE	6
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO	6
Area esterna	6
Disegni allegati	6
Interventi da realizzare	6
DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELL'AREA DI CANTIERE	7
COMMITTENTE E SOGGETTI INCARICATI	7
PARTE B: PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA.....	8
Gestione delle attività contemporanee o successive	9
SITUAZIONE AMBIENTALE.....	10
Rischi dovuti al contesto ambientale	10
Traffico veicolare esterno.....	10
MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE	10
Organizzazione delle aree di cantiere.....	10
Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere	10
Viabilità di cantiere	10
Servizi logistico-assistenziali di cantiere	11
Aree di deposito dei materiali	11
Segnaletica di sicurezza.....	11
Gestione emergenza.....	12

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori	13
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	14
Sorveglianza sanitaria	14
Gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere	15
Gestione e presenza di fornitori in cantiere	15
Impianti di cantiere	15
Impianto elettrico	15
Impianto di messa a terra	16
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	16
Impianto idrico	16
Impianto di illuminazione	16
Macchine e attrezzature	17
Misure generali di protezione da adottare contro rischi particolari	18
Rischio di seppellimento all'interno di scavi	18
Rischio di caduta dall'alto di persone e/o materiali	18
Sollevamento o trasporto di materiali	18
Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi	19
Rischi derivanti dall'esecuzione di lavori all'aperto	19
Rischio di incendio o di esplosione	19
Rischio di annegamento	19
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA	20
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE	21
Rischi per terzi all'esterno del cantiere	21
Rischi in generale all'interno del cantiere nelle diverse fasi lavorative	21
PARTE C : PRECAUZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI	22
IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI	23
Identificazione del responsabile di cantiere	23
Identificazione delle imprese coinvolte nell'attività di cantiere	23
Identificazione personale	23
MODALITÀ DI GESTIONE DEL PSC E DEL POS	24
Revisione del piano	24
Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento	24

Piano operativo di sicurezza	24
AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	25
Coordinamento delle imprese presenti in cantiere	25
Riunione preliminare all'inizio dei lavori	25
Riunioni periodiche durante l'effettuazione dell'attività	25
Sopralluoghi in cantiere	26

PREMESSA

Nel presente documento sono stati analizzati e valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l'esecuzione dei lavori, relativamente ai rischi di tipo interferenziale ed ambientale, al fine di informare l'impresa appaltatrice e le imprese esecutrici, circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno all'interno del cantiere, nonché le misure preventive e protettive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

L'impresa appaltatrice, ed ogni altra Impresa esecutrice, dovrà valutare attentamente i contenuti delle disposizioni, ben consapevole della successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti.

L'impresa appaltatrice, qualora trovi discordanze su alcuni punti del documento rispetto alle proprie modalità operative ed organizzative, dovrà concordare con il Coordinatore per l'esecuzione, le scelte lavorative che riterrà migliorative sul piano della prevenzione.

In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia realizzato un proprio piano operativo di sicurezza (POS) sulle attività di propria specifica competenza, da considerarsi quale piano complementare di dettaglio del presente documento, e tale POS, prima dell'inizio dei lavori, sia messo a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione, che ne dovrà verificare l'idoneità.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato allo specifico punto riguardante la normativa di riferimento.

Si tiene a precisare che il PSC affronterà non solo i rischi interferenziali ed ambientali delle lavorazioni di tipo "edile", ma anche quelle di tipo impiantistico non espressamente richieste dalla legge in vigore.

Abbreviazioni e definizioni

Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento.

PSC	Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione dell'opera
POS	Piano operativo di sicurezza, redatto da parte delle imprese esecutrici
RL	Responsabile dei lavori nominato dal Committente
DL	Direzione dei lavori
CSP	Coordinatore in fase di progettazione dell'opera
CSE	Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera

PARTE A: IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEGLI OGGETTI COINVOLTI

Anagrafica del cantiere

<i>Natura dell'opera</i>	lavori di manutenzione e di pronto intervento agli impianti tecnologici dei porti di Genova, Voltri, Savona e Vado.
<i>Data presunta di inizio lavori</i>	Giugno 2019
<i>Durata del cantiere in gg</i>	730 gg (solari consecutivi)
<i>N° max lavoratori</i>	6

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esercizio della manutenzione, di pronto intervento, e di reperibilità, degli impianti elettrici, telefonici presenti nei fabbricati, magazzini nell'area demaniale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova.

AREA ESTERNA

- Il cantiere sarà dimensionato opportunamente per consentire alla o alle Imprese di potervi operare in condizioni di sicurezza ed evitare quindi la presenza di rischio interferenziale sia con altre imprese che con il terminalista. Provvisoriamente, ovvero solo per il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni, verranno adibite a cantiere un consistente numero di aree per la realizzazione dei lavori e qualunque altra lavorazione oggetto dell'appalto.
- Le aree di cantiere permanenti e provvisorie saranno recintate.
- Le lavorazioni saranno eseguite di giorno per avere un illuminamento adeguato dell'area di lavoro.

DISEGNI ALLEGATI

- Durante la durata dei lavori il Porto continuerà a lavorare a pieno regime. Per rendere possibile il passaggio dei mezzi. Come ribadito nei paragrafi successivi, non si potranno effettuare lavorazioni inerenti l'appalto in assenza di recinzione ed in presenza di passaggio di mezzi o persone all'interno delle aree di cantiere.

INTERVENTI DA REALIZZARE

Per una più estesa descrizione dell'opera da realizzare e delle attività lavorative necessarie, si rimanda agli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo dell'opera.

Descrizione del contesto dell'area di CANTIERE

- L'area in cui si andranno a realizzare i lavori sarà completamente recintata a carico dell'Impresa.
- Durante le lavorazioni il terminalista continuerà a lavorare nelle vicinanze del cantiere a pieno regime.
- Per rendere possibile il passaggio dei mezzi (autoarticolati, gru semoventi ed altro), potrebbe essere necessario rimuovere momentaneamente la recinzione delle aree di cantiere provvisorie coprendo gli scavi con piatti d'acciaio sufficientemente spessi, per garantire il passaggio dei mezzi sopra citati. Come ribadito nei paragrafi successivi, non si potranno effettuare lavorazioni inerenti l'appalto in assenza di recinzione ed in presenza di passaggio di mezzi o persone all'interno delle aree di cantiere.

committente e soggetti incaricati

Si riportano i nominativi dei soggetti incaricati dal Committente per la gestione dei lavori dipendenti della Autorità di sitmea portuale del mar ligure occidentale.

Committente

Dott. E. Signorini, Presidente

Responsabile unico del procedimento

Dott.Geol.Giuseppe Canepa

Responsabile dei Lavori

Dott.Geol.Giuseppe Canepa

Progettisti

Ing. Davide Sciutto

Per. Ind. Ignazio Barraco

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera

Ing. Davide Sciutto

Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Ing. Davide Sciutto

La trasmissione del PSC all'impresa aggiudicataria, vale come comunicazione dei nominativi del CSP e del CSE.

Il CSE manterrà aggiornato l'elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, all'impresa aggiudicataria che provvederà a trasmetterli a tutti gli altri soggetti da essa coinvolti per l'esecuzione dei lavori.

Il CSE integra il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Il PSC verrà illustrato nei dettagli in occasione della prima riunione di coordinamento.

PARTE B: PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONTEMPORANEE O SUCCESSIVE

Dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o contemporaneamente tra di loro. Nello svolgimento di dette attività si nasconde un elevato livello di rischio.

Per attività interferenti s'intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.

Dal cronoprogramma emergono alcune sovrapposizioni temporali delle lavorazioni; le sovrapposizioni sono tali solo dal punto di vista temporale mentre spazialmente saranno condotte in luoghi distinti tra loro. Per questo motivo si ritiene di non dover entrare nel dettaglio di misure specifiche per la gestione dell'interferenza, ma di fornire misure di carattere generale gestendo poi le problematiche effettive durante l'esecuzione delle opere.

Visto il cronoprogramma, l'impresa non dovrebbero mai lavorare contemporaneamente e nella stessa area di cantiere perchè le Imprese che intervengono prima effettuano lavorazioni necessarie e propedeutiche ai lavori che svolgeranno le seconde.

Nel caso in cui si dovessero verificare interferenze sia temporali che spaziali, il direttore tecnico dell'impresa capo commessa deve prontamente avvisare il CSE che redigerà opportune integrazioni al PSC se ritenuto necessario per gestire correttamente le interferenze.

In generale, per la gestione di attività interferenti e successive che si presenteranno nello svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera, si terrà presente quanto segue:

- le attività da realizzarsi, nell'ambito della stessa area, da parte di diverse imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice, tale preposto potrà anche essere un lavoratore di una delle imprese impegnate nelle suddette attività;
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l'esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività ed inoltre si svolgeranno adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio, quali aspirazione delle polveri e dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza da adottare;
- ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore autonomo prima di abbandonare, anche temporaneamente, il proprio luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. In particolare gli esecutori dovranno prestare attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle opere provvisorie, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali sistemati in modo non stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle pavimentazioni. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l'impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne darà immediata informazione al DL e al CSE. L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile dell'attuazione di quanto sopra;
- l'impresa capo commessa predisporrà il presidio sanitario e quello antincendio.

Per le situazioni particolari di interferenza si rimanda all'allegato "Analisi e valutazione dei rischi delle fasi lavorative".

SITUAZIONE AMBIENTALE

RISCHI DOVUTI AL CONTESTO AMBIENTALE

Si ribadisce la necessità di prestare molta attenzione alle attività svolte dal terminalista in prossimità dell'area di cantiere

Traffico veicolare esterno

Attorno alle aree di cantiere è previsto un consistente traffico veicolare connesso all'attività svolta dal terminalista. Per evitare collisioni, si prevede la necessità della presenza di una persona per coadiuvare l'autista dell'automezzo in uscita dal cantiere. La viabilità interna del terminal è indicata sulle tavole progettuali allegate.

MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

Nel presente capitolo sono riportate le prescrizioni di carattere generale che l'impresa appaltatrice dovrà seguire per organizzare i propri lavori in sicurezza.

L'organizzazione delle aree di cantiere è stata prevista come segue:

- non è necessario il montaggio di un mezzo di sollevamento fisso perchè la caratteristica dei lavori suggerisce il noleggio quando necessario.
- l'impresa dovrà utilizzare gli spazi interni all'area di cantiere permanente per piazzare le proprie attrezzature e servizi.

Recinzioni, accessi e segnalazione del cantiere

a) Recinzioni

Il cantiere a terra dovrà essere recintato per impedire il passaggio di persone e mezzi non facenti parte dell'Impresa. La recinzione dovrà correre lungo tutto il confine dell'area di montaggio e dovrà essere alta almeno 2 metri e di tipo rigido per non essere facilmente scavalcata.

b) Segnalazione dell'area di cantiere

L'area di cantiere avrà segnalazioni visibili sia via mare che via terra.

c) Accessi alle aree di cantiere

Gli accessi al cantiere saranno come definiti negli elaborati progettuali allegati.

Viabilità di cantiere

Non risulta necessario definire a priori la viabilità di cantiere per la ridotta dimensione del cantiere stesso. Di volta in volta dovrà essere studiata in modo da non interessare luoghi pericolosi. Risulta invece importante la definizione delle aree di cantiere.

Servizi logistico-assistenziali di cantiere

E' necessario che l'impresa procuri servizi igienici di cantiere.

Si rende necessaria la presenza di un locale di ricovero in caso di intemperie.

E' vietato consumare pasti all'aperto. Dovranno essere consumati in apposito box approvigionato dall'impresa.

Aree di deposito dei materiali





Le zone di stoccaggio dei materiali, all'interno del cantiere osserveranno le seguenti prescrizioni minime:

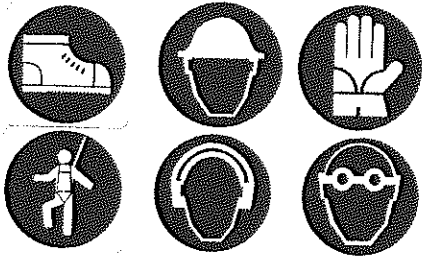



- le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;
- i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un'agevole movimentazione sia manuale che attraverso macchine operatrici;

I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato, separati per tipologia di materiale e allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei.

Segnaletica di sicurezza

In cantiere si posizionerà solo segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n° 493/1996. La segnaletica si posizionerà in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e sarà rimossa non appena sia terminato il rischio a cui si riferisce.

Segnale di sicurezza	Collocazione del segnale di sicurezza
 Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attività di cantiere ed in particolare: - sulla recinzione di accesso al cantiere - in prossimità delle delimitazioni o di zone dove si eseguiranno particolari attività
 Avvertimento di zona pericolosa	Delimitazione di aree pericolose, ostacoli, dislivelli.
	Ai piedi dei ponteggi e all'ingresso dei locali dove si dovranno realizzare delle lavorazioni in altezza
 Pericolo di caduta all'interno di scavi, di aperture nel suolo e luoghi sopraelevati, pericolo di inciampo	In prossimità delle zone dove sono presenti scavi, aperture all'interno della pavimentazione, luoghi in altezza da cui è possibile cadere, ostacoli nel terreno.

Segnale di sicurezza	Collocazione del segnale di sicurezza
 <p>Obbligo di utilizzo dei DPI</p>	<p>In prossimità degli accessi al cantiere, per i DPI di utilizzo generale</p> <p>In zone particolari o presso le attrezzature che lo richiedano, per i DPI specifici</p>
 <p>Estintore</p>	<p>Nelle vicinanze degli estintori di cantiere</p>
 <p>Presidio di pronto soccorso</p>	<p>All'esterno delle baracche dove sono posizionate cassette di pronto soccorso e pacchetti di medicazione</p>
 <p>lavori in corso</p>	<p>In prossimità delle aree di cantiere fisse e provvisorie</p>

Gestione emergenza

Il capocantiere dell'impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà organizzare (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che avessero a verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

Il capocantiere dovrà comunicare il proprio numero di cellulare ai lavoratori per essere prontamente avvertito in caso di emergenze.

In cantiere saranno indicati in buona evidenza i principali numeri telefonici per la gestione delle emergenze, le modalità di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e dell'emergenza sanitaria.

Lotta antincendio

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o quando si faccia utilizzo di fiamme libere, dovrà essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso minimo di 6 kg, reso disponibile da chi esegue i suddetti lavori.

Ciascuna impresa esecutrice, per le parti di propria competenza, si farà carico della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza. Ogni impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per la parte di cantiere di propria competenza.

Primo soccorso, presidi sanitari

Ogni impresa avrà in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sarà sempre disponibile ai lavoratori, preferibilmente si posizionerà in baracca e/o sugli automezzi presenti nei pressi del cantiere.

Comunicazione al CSE dell'eventuale accadimento di infortuni

Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un giorno, al termine dei soccorsi l'impresa appaltatrice avviserà immediatamente il CSE.

Comunicazione al CSE di incidenti senza danni a persone

Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, l'impresa appaltatrice dovrà darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente è un importante segnale in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive. Sarà indetta una riunione per evidenziare le cause dell'incidente.

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali saranno esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno produrre al CE una dichiarazione circa l'avvenuta informazione e formazione. Il CSE potrà chiedere gli attestati comprovanti la formazione effettuata ai lavoratori.

I lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere stati adeguatamente addestrati alla specifica attività. Gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di formazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati secondo quanto previsto dalla legge. Ogni impresa dovrà fornire al CE una dichiarazione in cui si attesti che il RLS ha preso visione del PSC e del POS.

Il CSE potrà richiedere il registro degli infortuni al RLS.

Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	
o Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
<input type="checkbox"/> Accettazione PSC	<input type="checkbox"/> Modifiche significative al PSC
<input type="checkbox"/> Attività di prevenzione e corsi formazione	<input type="checkbox"/> POS
o Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
<input type="checkbox"/> PSC	<input type="checkbox"/> Modifiche significative al PSC
<input type="checkbox"/> POS	<input type="checkbox"/> Programma di formazione alla sicurezza
o Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere	
<input type="checkbox"/> Sopralluoghi in cantiere	<input type="checkbox"/> Riunioni specifiche con il CSE

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Tutti lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione sul loro utilizzo.

I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L'impresa appaltatrice terrà presso il cantiere almeno 3 elmetti da fornire ai visitatori che ne fossero sprovvisti. Tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell'impresa. I visitatori che eventualmente accedano ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.

Tipo DPI	Zona protetta	Mansione
Elmetto di protezione	Testa	• <i>Tutte</i>
Occhiali di sicurezza	Occhi	• <i>Tutte</i>
Maschera antipolvere prot. FFP1	Vie respiratorie	• <i>Tutte</i>
Guanti da lavoro	Mani	• <i>Tutte</i>
Scarpe con puntale e lamina	Piedi	• <i>Tutte</i>
Cuffie o tappi	Apparato uditivo	• <i>Tutte</i>
Tuta da lavoro	Corpo	• <i>Tutte</i>
Maschera per vapori di saldatura	Vie respiratorie	• <i>Fabbro edile</i>
Maschera saldatura	Occhi	• <i>Fabbro edile</i>
Guanti in gomma per prodotti chimici	Mani	• <i>Muratore</i>
Imbracatura di sicurezza	Corpo	• <i>Ponteggiatori</i> • <i>Altre attività da svolgere in altezza</i>
Ciubbetti ad alta visibilità	Persona	• <i>Tutte</i>

Sorveglianza sanitaria

Tutto il personale di cantiere dovrà essere in possesso di "idoneità specifica alla mansione" rilasciata dal medico competente dell'Impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima dell'inizio delle proprie attività lavorative, comunicheranno al CE nome e recapito del proprio medico competente e presenteranno una dichiarazione sull'idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L'Impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.

Gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere

L'impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell'evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza nell'area dopo l'inizio dell'attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: imballaggi e contenitori, materiali di risulta provenienti da demolizioni, contenitori di sostanze impiegate nei lavori, scarti di lavorazione, ecc.

Il responsabile di cantiere dell'Impresa assicurerà il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità.

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006; il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.

Gestione e presenza di fornitori in cantiere

I fornitori di materiale che a qualsiasi titolo entrano in cantiere, dovranno essere dotati dei DPI necessari rispetto all'attività che si esegue in quel momento, in modo da garantire la propria sicurezza.

L'impresa da cui i fornitori dipendono dovrà presentare un proprio POS riportante le attenzioni che gli autisti dei fornitori stessi dovranno adottare quando si trovano in cantiere.

IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico

Fornitura di energia elettrica

L'impresa appaltatrice prima dell'inizio del cantiere richiederà all'ENEL un allaccio di cantiere. Il contatore ed il quadro elettrico principale omologato ASC saranno posti all'interno del cantiere.

I cavi di alimentazione a bassa tensione, all'interno ed all'esterno, se previsti, dell'area di montaggio dovranno essere, se possibile, in cunicolo od opportunamente protetti per evitare infortuni per elettrocuzione. Se i cavi dovessero attraversare una strada di servizio del Terminal, dovrà essere prevista una protezione di tipo carrabile e si farà in modo di limitare la necessità di detto accorgimento per il tempo strettamente necessario.

Impianto elettrico di cantiere

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato da un elettricista qualificato che provvederà al rilascio della dichiarazione di conformità prevista dalla legge 37/08.

Le linee principali derivanti dal quadro principale posto subito a valle del punto di consegna, porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti le prese per l'alimentazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti indiretti.

Ai quadri di distribuzione resi operativi dall'impresa, si collegheranno anche le eventuali imprese subappaltatrici chiamate a svolgere parte delle operazioni previste nella fornitura.

Saranno ammesse prolunghe di alimentazione di tipo mobile conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, dovrà essere limitato al minimo l'utilizzo delle prolunghe.

Si ricorda l'assoluto divieto di connessione degli apparecchi utilizzatori con sistemi diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).

I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo "a parete", con apposito supporto su un piano orizzontale e dovranno esser muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di presa.

Le linee di alimentazione e distribuzione dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla caduta di tensione ed alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. L'installazione dovrà essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione meccanica sulle connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento.

Per le apparecchiature di tipo "trasportabile", "mobile" o "portatile", dovranno essere utilizzati solo cavi con conduttore flessibile in grado di assicurare l'adeguata resistenza all'acqua e all'abrasione. Per le apparecchiature di tipo "fisso", invece, è possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l'uso, delle stesse caratteristiche.

Uso dell'impianto elettrico

L'impresa appaltatrice vigilerà affinché l'utilizzo dell'impianto avvenga in conformità alle norme di legge e di buona tecnica vigenti; qualunque modifica significativa all'impianto dovrà essere autorizzata dal Responsabile di cantiere dell'impresa in quanto sarà necessaria l'emissione di una nuova dichiarazione di conformità per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.

Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici, così come detto precedentemente, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il CSE verificasse l'utilizzo di materiale non conforme, vieterà immediatamente l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

Impianto di messa a terra

L'impresa provvederà contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico, alla realizzazione del proprio impianto di messa a terra.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

La struttura risulta non esposta al rischio di scarica atmosferica per altezza e materiale impiegato. Si prescrive tuttavia di non eseguire lavorazioni sui viadotti in presenza di condizioni meteo avverse.

Impianto idrico

L'impresa appaltatrice chiederà, se ritenuto necessario, all'Ente gestore un allacciamento temporaneo di cantiere. Il punto di allaccio e i punti di presa dovranno essere tenuti adeguatamente distanti da quadri e sottoquadri elettrici.

Impianto di illuminazione

L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili aventi classe II, cioè dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza collegamento di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V.

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili, dovranno avere la linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale con soglia d'intervento $I_{dn} \leq 30\text{mA}$. Infine, si raccomanda la massima attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi trasportabili in modo da evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e mezzi di notevole peso e dimensioni.

L'eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili, cioè di comuni lampade elettriche, sarà tassativamente vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEI che prevedono l'uso di apparecchi di classe III dotati di involucro a isolamento ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 50 V (bassissima tensione di sicurezza SELV).

Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non ci sia l'illuminazione diurna, saranno predisposte un numero idoneo di lampade di sicurezza od in alternativa gli addetti dovranno essere dotati di lampade portatili con batteria che garantisca almeno 30 minuti di durata.

MACCHINE E ATTREZZATURE

Nel cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine, nella scelta e nell'installazione, dovranno essere rispettate da parte dell'impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell'invio in cantiere delle macchine. Dovranno essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine e impianti.

L'impresa e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno disporre la seguente documentazione, necessaria a comprovare all'Organo di Vigilanza la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle macchine utilizzate:

1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:
 - rispetto delle normative
 - perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:

- mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari);
 - attrezzature per il taglio ossiacetilenico;
 - seghe circolari a banco e similari;
 - altre ad insindacabile giudizio del CE.
2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:
 - tipo e modello della macchina;
 - stato di efficienza dispositivi di sicurezza;
 - stato di efficienza dei dispositivi di protezione;
 - interventi effettuati.

La documentazione di cui sopra sarà consegnata al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e tenuta a disposizione dell'Organo di Vigilanza.

E' consentito l'utilizzo della stessa attrezzatura da parte di diverse imprese; l'impresa proprietaria o gestrice dell'attrezzatura dovrà verificarne al momento della consegna la conformità normativa e il perfetto stato di manutenzione. L'impresa che la prenderà in uso dovrà impegnarsi a usare la stessa conformemente alla legge ed evitare qualsiasi manomissione specialmente alle protezioni. La responsabilità della manutenzione e del rispetto normativo dell'attrezzatura rimane in capo al proprietario o al gestore della stessa (impresa che l'ha portata in cantiere).

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

Rischio di seppellimento all'interno di scavi

La tipologia della fornitura non lo prevede in quanto gli scavi non sono tanto profondi da rendere necessari accorgimenti particolari.

Rischio di caduta dall'alto di persone e /o materiali

Nell'esecuzione dei lavori occorre predisporre dei particolari interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o di oggetti dall'alto. Le persone che si devono salvaguardare sono sia quelle presenti all'interno del cantiere che i terzi all'attività dell'impresa che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni. Per le operazioni sopra descritte si richiede l'uso della cintura di sicurezza. In generale dovranno adottarsi le seguenti misure di protezione:

Lavori da svolgersi in altezza

Caduta di persone dall'alto

Per tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri, per esempio sul tetto della cabina o sui pali di illuminazione si utilizzeranno idonee opere provvisorie. L'altezza di lavoro corrisponde a quella di massima caduta.

Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisorie si potrà operare utilizzando l'imbracatura di sicurezza. In questo caso l'impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l'uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminarmente comunicazione al CSE, se non previsto nel POS.

Caduta di materiali dall'alto

Utilizzo dell'elmetto protettivo da parte degli addetti all'attività. Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Quando si eseguiranno lavorazioni che comportino rischio di questo tipo, una persona, in costante contatto con gli operativi del Terminal, regolerà il passaggio di persone e mezzi nella zona sottostante alle lavorazioni.

Sollevamento o trasporto di materiali

Caduta di materiali dall'alto

Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l'apposizione della segnaletica di sicurezza riportata al punto 7.1.5. Le operazioni saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto.

Per le operazioni di sollevamento si dovranno utilizzare accessori di imbraco in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti di legge.

Particolare attenzione dovrà essere posta durante la posa di elementi in CAP. Durante tutte le operazioni di carico e scarico non dovranno essere presenti persone nell'area sottostante all'elemento prefabbricato. Se necessario, saranno usate corde o cavi imbracati all'elemento per regolarne la posizione nelle fasi finali delle operazioni di scarico. Le persone dovranno stare ad una adeguata distanza che tenga in considerazione il possibile ribaltamento della autogru di movimentazione.

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Nell'esecuzione delle lavorazioni si cercherà di limitare al minimo indispensabile la movimentazione manuale di carichi, pertanto l'impresa dovrà progettare e programmare i lavori in modo da massimizzare l'utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto.

Nei casi in cui fosse indispensabile la movimentazione manuale, questa dovrà avvenire sempre in modo da non esporre le persone a rischio, organizzando il lavoro in modo da prevedere la presenza di più persone per il sollevamento di carichi pesanti ed eventualmente la turnazione delle persone esposte al rischio.

Rischi derivanti dall'esecuzione di lavori all'aperto

In caso di condizioni climatiche avverse i lavori esterni saranno immediatamente sospesi.

Rischio di incendio o di esplosione

In generale all'interno dell'area di cantiere, le principali situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti:

- fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l'ossitaglio;
- fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori;
- stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura;
- cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici;
- accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ecc.) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.);
- mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone di lavoro in cui si fa uso o sono presenti prodotti infiammabili.

Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso. L'adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.

Rischio di annegamento

Si esclude il rischio di annegamento in quanto l'aerea di cantiere dista molto lontano dal profilo di banchina.

DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

A scopo preventivo e per esigenze normative, sarà tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata. La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla Impresa appaltatrice, dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi. La documentazione di sicurezza deve essere presentata al CE ogni volta che ne faccia richiesta.

Documentazione inerente l'organizzazione dell'impresa

Copia di iscrizione alla CCIAA.

Dichiarazione dell'appaltatore dell'applicazione del CCNL e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ogni tre mesi dovrà essere fornito il certificato di regolare versamento dei contributi prodotto dall'ente preposto. *(Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori).*

Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.

Piano di sicurezza e coordinamento *(In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento).*

Piano operativo di sicurezza *(Dell'impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici).*

Verballi di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Registro infortuni *(Nel caso in cui l'impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori).*

Copia della notifica preliminare aggiornata *(La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere e sarà fornita a cura del CE).*

Impianti elettrici di cantiere

Certificato di conformità quadri elettrici ASC.

Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione di mezzi ad azionamento non manuale di portata superiore a 200 kg.

Registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene.

Libretto di omologazione del radiocomando.

Ponteggi metallici fissi

Libretto di autorizzazione ministeriale.

Schema di montaggio.

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere.

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d'uso e manutenzione.

Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine.

Registro di verifica periodica delle macchine.

Prodotti e sostanze chimiche

Schede di sicurezza.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI LAVORATIVE

Nel presente capitolo è riportata l'analisi e la valutazione dei rischi che si potranno presentare durante l'esecuzione dei lavori. Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

RISCHI PER TERZI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

In questo punto si prendono in considerazione i rischi generali ai quali si possono trovare esposte le persone estranee all'attività di cantiere.

<i>Situazione</i>	<i>Rischi</i>	<i>Misure di prevenzione</i>
Circolazione di veicoli da e per il cantiere nell'area esterna allo stesso	Incidente Urto contro persone	Il rischio è elevato perchè la zona è molto trafficata. Il traffico pedonale è piuttosto scarso. Nelle aree esterne limitrofe al cantiere, i veicoli procederanno a velocità ridotta. Durante l'esecuzione di manovre con scarsa visibilità l'autista si farà sempre aiutare da un lavoratore a terra.
Movimentazione di materiali all'esterno delle recinzioni	Urto da materiale da montare in fase di movimentazione	Le zone dove si eseguono i lavori saranno delimitate mediante l'apposizione di barriere e nastro di colore bianco e rosso. In cantiere è vietato l'accesso a personale della Committenza e del Terminal non interessato dagli specifici lavori.

RISCHI IN GENERALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE NELLE DIVERSE FASI LAVORATIVE

Nel documento allegato sono riportati, per ciascuna delle fasi delle lavorazioni in cui è articolata l'esecuzione delle lavorazioni previste in cantiere, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi. Ovviamente, l'applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche dalla normativa vigente i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna Impresa presente a vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti. Non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell'esecuzione dell'opera.

Il presente documento, quindi, essenzialmente riguarda la definizione delle scelte:

- progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;
- tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.

Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l'Impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate.

PARTE C : PRECAUZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE, IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

La realizzazione delle opere oggetto del presente documento è compito dell'impresa aggiudicataria. Tutte le imprese e/o i lavoratori autonomi coinvolti nell'attività, prima dell'inizio dei lavori, comunicheranno i propri dati identificativi al CE. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare al CE, il nominativo del proprio responsabile di cantiere che dovrà essere il direttore tecnico dell'Impresa con ruoli dirigenziali.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L'impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo tempestivamente al CE, provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà.

Dovrà essere comunicato il nominativo del preposto ovvero del capocantiere nonché del responsabile della sicurezza dell'Impresa.

Le tre persone dovranno identificarsi a mezzo di valido documento di riconoscimento, una copia del quale verrà conservata dal CSE.

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell'attività di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CE; contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all'interno del cantiere.

I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative.

L'appaltatore consegnerà al CE la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.

Si evidenzia che nel cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui, si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CE richiederà alla DL e al RL l'allontanamento immediato dal cantiere di dette persone.

IDENTIFICAZIONE PERSONALE

In cantiere dovrà essere disponibile a semplice richiesta la fotocopia della carta d'identità associata al nome dell'Impresa di ogni lavoratore presente in cantiere.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PSC E DEL POS

Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l'appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell'opera.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CE valuterà tali proposte e, se ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del PSC, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione dall'appaltatore da cui dipendono contrattualmente. L'appaltatore dovrà attestare la consegna o la messa a disposizione del PSC ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un modulo di ricevuta.

REVISIONE DEL PIANO

Il PSC finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

- Modifiche organizzative;
- Modifiche progettuali;
- Varianti in corso d'opera;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione di nuova tecnologia non prevista nel presente piano;
- Introduzione di macchine e attrezzature non previste nel presente piano.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il CE, in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all'Appaltatore attestando l'azione mediante un modulo di consegna.

L'appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori, con firma di un idoneo modulo.

Il PSC potrà essere aggiornato anche attraverso i verbali delle riunioni di coordinamento e i verbali di sopralluogo.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il POS dovrà essere redatto dall'Impresa aggiudicataria e da ogni impresa esecutrice che eventualmente interverrà in subappalto, per forniture o con noli a caldo.

Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell'Impresa aggiudicataria e consegnati al CE prima dell'inizio delle attività lavorative di cantiere delle imprese stesse.

I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

I POS dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell'impresa e portare il visto del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori dell'Impresa o territoriale.

AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE

Il CE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Il CE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente documento o dal PSC.

Nell'ambito di questo coordinamento, è compito dell'impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni assunte durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'Impresa assieme al CE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al CE, l'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione contro firmate dai subappaltatori e/o fornitori.

Il CE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che dette informazioni siano effettivamente giunte loro da parte dell'Impresa appaltatrice.

Il CE durante l'esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunioni periodiche cui dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel momento in cantiere.

RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORI

Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal CE cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che dovranno far intervenire anche i Responsabili di cantiere delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere.

Durante la riunione preliminare il CE illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza.

Le imprese potranno presentare proposte di modifica e integrazione al piano e/o osservazioni a quanto esposto dal CE.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che, dopo essere stato letto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Quando ritenuto necessario, saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare.

Durante la riunione, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere. Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

Il CE in fase di esecuzione, anche in relazione all'andamento dei lavori, ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.

SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

In occasione della sua presenza in cantiere, il CE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell'Impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo sarà stato comunicato all'atto della prima riunione) per verificare l'attuazione delle misure previste nel PSC e nei POS ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il CE farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell'impresa inadempiente e se l'infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare sollecitamente la situazione.

Il CE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni in merito all'andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto dei vari documenti e delle norme di sicurezza aumenta la probabilità di infortunio, specialmente se grave, il CE in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione, e se ciò non fosse possibile, procederà all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dalla norma. Qualora il caso lo richieda, il CE potrà concordare con il responsabile dell'impresa nuove istruzioni di sicurezza non previste dal PSC.

Le istruzioni saranno comunicate per iscritto e saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell'Impresa appaltatrice.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza per il presente appalto sono i seguenti:

Oneri diretti stimati	Euro 2.200,00
Oneri speciali	Euro 20.000,00

Totale costi sicurezza	Euro 22.200,00

Nella pagina sottostante è riportato il computo analitico sulla determinazione dei suddetti costi per la sicurezza.

n°	Descrizione	UM	Quantità	P.U.	Costo	Onere	
						Diretto	Speciale
					totale	1	2
A	Apprestamenti						
	Recinzioni aree di cantiere provvisorie come descritto in PSC con adeguata visibilità	corpo	1	2.940,00	2.940,00	0	2940
B	Gestione dei rischi interferenziali ed ambientali						
	Sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni per eliminare o ridurre i rischi interferenziali con la conseguente perdita di produttività come descritto in PSC	Corpo	1	5.000,00	5.000,00	0	5000
	Sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni per eliminare o ridurre i rischi ambientali compresi quelli per garantire la continuità di servizio del Terminal come descritto in PSC	Corpo	1	4.900,00	4.900,00	0	4900
C	Protezioni collettive						
	Redazione ed aggiornamento del POS	misura	25	50,00	1.250,00	0	1250
	Redazione piano d'emergenza	misura	5	50,00	250,00	0	250
	Controlli per prevenzione incendi e squadre d'emergenza	misura	20	25,00	500,00	0	500
	Partecipazione, cooperazione e controllo della sicurezza nel cantiere da parte dell'Impresa incluso riunioni per la sicurezza	misura	60	25,00	1.500,00	0	1500
	installazione quadri	corpo	1	500,00	500,00	500	0
	installazione cavi	corpo	1	500,00	500,00	500	0
	Realizzazione cavidotti, basamenti torre faro e cabina, carpenterie ed altre opere civili	corpo	1	1.200,00	1.200,00	1200	0
	Arredamento dello spogliatoio	corpo	1	200,00	200,00	0	200
D	Protezioni individuali						
	Controllo sanitario per ogni lavoratore ed eventuali accertamenti aggiuntivi	misura	6	100,00	600,00	0	600
	DPI guanti	misura	20	6,00	120,00	0	120
	DPI casco	misura	6	30,00	180,00	0	180
	DPI mascherina	misura	200	0,10	20,00	0	20
	DPI occhiali antischegge	misura	6	10,00	60,00	0	60
	DPI giubbotto alta visibilità	misura	6	10,00	60,00	0	60
	DPI scarpe	misure	5	60,00	300,00	0	300
	DPI salvagenti	misura	2	100,00	200,00	0	200
	Cassetta del pronto soccorso come indicato nel DPR	Misura	2	55,00	110,00	0	110

E	Procedure contenute nelle disposizioni preliminari e nel PSC previste per specifici motivi di sicurezza						
	Adeguate controllo e manutenzione macchine per quanto concerne la sicurezza	Misura	25	20,00	500,00	0	500
	Quota parte sicurezza per l'installazione degli impianti nel cantiere tra cui verifica impianto di terra, verifica a fulminazione atmosferica, quadri di cantiere certificati ASC.	Corpo	1	650,00	650,00	0	650
	estintori	misura	1	60,00	60,00	0	60
	Informazione e formazione lavoratori	misura	20	20,00	400,00	0	400
	Cartellonistica relativamente alla sicurezza	Corpo	1	200,00	200,00	0	200
	TOTALE ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA						20.000,00
	TOTALE ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA					2.200,00	
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA				22.200,00		
